

Novo Kanban Crisdu Labs

Informações do Projeto

Objetivo do projeto:

Estruturar um Kanban funcional que atenda a todas as necessidades de tarefas e Projetos do Crisdu Labs.

Sistemas/Apps impactados:

Kanban e Optimus Projetos (2700)

Figma: Estruturação do novo Kanban será feita através do VS Code/CODEX. Exemplo de estilo visual base do novo quadro abaixo:

Estrutura do Sistema Kanban:

Hoje, a empresa possui um sistema de atendimento onde os usuários registram suas solicitações por meio de chamados (tickets).

Quando um analista técnico avalia uma solicitação e identifica que a demanda possui maior complexidade, especialmente quando envolve desenvolvimento estruturado, múltiplas etapas ou impacto sistêmico, essa demanda é encaminhada para a área de PMO.

A partir desse momento, a PMO é responsável por transformar esse chamado em um projeto estruturado, criando um card principal que centraliza toda a gestão da demanda.

Definição de Projeto: Um **projeto** representa a estrutura completa de execução de uma demanda complexa. Ele é composto por múltiplos níveis hierárquicos de atividades, permitindo detalhamento progressivo do trabalho.

De forma geral, o projeto funciona como um **container principal**, que organiza todas as etapas, atividades e entregas necessárias para atingir um objetivo específico.

Exemplo:

Objetivo do projeto: Desenvolver um sistema contábil

Para atingir esse objetivo, o projeto é dividido em diferentes tarefas e níveis de detalhamento.
Estruturação do nível hierárquico do projeto:

1. Projeto (nível macro)

É o nível mais alto da estrutura.

- Representa o objetivo principal
- Centraliza todas as informações do projeto
- Contém todas as tarefas e suas subdivisões de forma visual dentro do card
- Permite acompanhamento macro (status, prazo, responsável, solicitante, título do projeto, tempo em horas usado em todos os níveis de tarefas/subtarefas e etc.)

👉 Exemplo:

"Criação de sistema contábil"

2. Tarefa (nível estratégico)

As tarefas representam os grandes blocos de trabalho dentro do projeto.

- Correspondem às principais etapas ou entregas
- Podem representar fases do projeto (ex: análise, design, desenvolvimento, etc.)

👉 Exemplos:

- Análise de negócio
- Análise técnica
- Design do sistema
- Documentação
- Desenvolvimento

3. Subtarefa (nível tático)

As subtarefas detalham as tarefas principais em atividades mais específicas.

- Representam ações necessárias para executar uma tarefa
- Já possuem um escopo mais direcionado

👉 Exemplo (dentro de “Análise de negócio”):

- Reunião inicial
- Levantamento de requisitos
- Documentação da análise
- Alinhamento com design

4. Subníveis (nível operacional)

A estrutura deve permitir múltiplos níveis de aprofundamento, sem limitação fixa.

Ou seja, uma subtarefa pode ser subdividida em novos níveis conforme necessário.

👉 Exemplo (dentro de “Documentação da análise”):

- Ajuste manual do documento
- Revisão do documento
- Validação com stakeholders

E assim sucessivamente, criando níveis mais específicos conforme a necessidade do projeto.

Modelo conceitual da hierarquia

De forma simplificada, a estrutura funciona assim:

- **Projeto**
 - contém **Tarefas**
 - que contêm **Subtarefas**
 - que podem conter **Subtarefas adicionais (níveis ilimitados)**

Resumo conceitual

- **Projeto**: visão macro e estratégica da demanda
- **Tarefa**: grandes blocos de execução do projeto
- **Subtarefa**: divisão da tarefa em ações mais específicas

Subníveis adicionais: detalhamento progressivo até o nível necessário de execução

Definição de EAP: A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) representa a decomposição lógica e organizada de um projeto em partes menores, facilitando o planejamento, execução e controle.

No contexto da ferramenta, a EAP não será utilizada como uma árvore completa de tarefas, mas sim como a definição das **fases macro do projeto**, ou seja, o fluxo que o projeto seguirá ao longo do tempo. De forma simplificada:

A EAP define **quais são as etapas (fases) que um projeto deve percorrer**, de acordo com seu tipo.

Aplicação prática no sistema

Cada tipo de projeto possui um fluxo diferente de execução. A EAP será responsável por padronizar esse fluxo.

Exemplo 1 — Projeto de Integração

- Análise inicial
- Execução
- Testes
- Entrega

Exemplo 2 — Evolução de Aplicativo

- Análise
- Documentação
- Aprovação
- Desenvolvimento
- Testes
- Homologação

👉 Ou seja:

A EAP funciona como um **template de fases**, que será aplicado automaticamente ao projeto no momento da sua criação.

Papel da EAP dentro do sistema

A EAP será responsável por:

- Definir as colunas do Kanban do projeto
- Estruturar os marcos principais (macro etapas)
- Padronizar o fluxo de execução
- Permitir consistência entre projetos semelhantes

Tela de cadastro de EAP (Área Administrativa)

Deve existir uma área específica no painel administrativo para gerenciar as EAPs.

A tela deve conter:

1. Lista de EAPs cadastradas

Exibir todas as EAPs existentes com:

- Nome da EAP
- Tipo de projeto associado (se houver)
- Quantidade de fases
- Status (ativo/inativo)
- Ações (editar / excluir)

2. Botão “Criar nova EAP”

Ao clicar, deve abrir um modal ou página de cadastro com os seguintes campos:

Cadastro de EAP

Nome da EAP

- Campo de texto livre
- Ex: “EAP - Projeto de Integração”

Tipo de projeto associado

- Campo de seleção
- Relaciona a EAP a um tipo de projeto (ex: Integração, Evolução, Suporte)

👉 Regra:

- Uma EAP pode estar vinculada a um tipo de projeto
- Ou ser genérica (opcional)

Descrição da EAP

- Campo de texto livre
- Explica quando essa EAP deve ser utilizada

Estrutura de fases (principal)

Esse é o ponto mais importante da tela.

Deve existir um componente que permita:

✓ Criar fases da EAP

Cada fase deve ter:

- Nome da fase (ex: Análise, Desenvolvimento, Testes)
- Ordem (posição no fluxo)
- Descrição da fase (opcional)

✓ Funcionalidades necessárias:

- Adicionar nova fase (botão +)
- Reordenar fases (drag and drop)
- Editar nome e descrição
- Excluir fases
- Definir ordem sequencial

✓ Exemplo visual esperado:

1. Análise
2. Documentação
3. Aprovação
4. Desenvolvimento
5. Testes
6. Homologação

Status da EAP

- Ativa / Inativa
- Apenas EAPs ativas podem ser usadas na criação de projetos

Regras:

1. Padronização

- Projetos devem iniciar com uma EAP definida
- Garante consistência entre execuções

2. Independência após criação

- Após aplicada, a EAP vira uma instância do projeto
- Alterações no projeto não afetam a EAP original

3. Reutilização

- Uma EAP pode ser usada em múltiplos projetos/Qualquer projeto do fluxo ao ser criado.

4. Governança

- Apenas usuários autorizados podem:
 - Criar EAPs
 - Editar EAPs
 - Excluir EAPs

5. Impacto no Kanban

- As fases da EAP = colunas do Kanban do projeto
- Mudança de fase = avanço no projeto

Diretriz importante do sistema

O sistema deve permitir:

- Hierarquia ilimitada de subtarefas
- Organização clara visualmente (lista e kanban)
- Rastreabilidade entre níveis
- Controle tanto macro (projeto) quanto operacional (subtarefas)
- EAP = template de fases do projeto
- Define o fluxo macro
- É cadastrada na área administrativa
- É aplicada no momento da criação do projeto

A partir da definição dos conceitos de projeto, tarefa e subtarefas, o processo de criação de um projeto deve ocorrer de forma estruturada dentro do sistema.

Como o controle dos projetos é realizado principalmente por meio do **quadro Kanban**, deve existir um ponto central de entrada para criação de novos projetos.

Esse fluxo deve funcionar da seguinte forma:

- O usuário autorizado (PMO) acessa o quadro Kanban
- Clica em um botão de ação (ex: “Criar Projeto”)
- É aberto um **modal/pop-up de criação de projeto**
- O usuário preenche os campos obrigatórios e complementares
- Ao salvar, o projeto é criado e passa a aparecer no fluxo do Kanban como um card

Todos os dados inseridos nesse momento devem ser refletidos posteriormente no card do projeto e em suas visualizações detalhadas. Todos os dados inseridos nesse momento devem ser refletidos posteriormente no card do projeto e em suas visualizações detalhadas.

Informações gerais do projeto:

1. Situação: Campo de seleção com valores padrão:

- Ativo
- Pausado
- Cancelado

👉 Define o estado atual do projeto no fluxo

2. Finalidade: Campo de seleção configurável, com opções como:

- Expansão
- Suporte
- Inovação

- Segurança
- Operacional
- Estratégico

👉 Regras:

- Deve ser possível **cadastrar novas finalidades**
- Deve ser possível **editar ou excluir finalidades existentes**

Gestão via área administrativa

3. Título do projeto

- Campo de texto livre

Representa o nome principal do projeto

4. Ticket de origem

- Campo de texto curto

Utilizado para registrar o número do chamado original

Relacionamentos e envolvidos

5. Cliente:

- Campo de seleção
- Deve permitir busca por texto (lupa + digitação)

Baseado no cadastro de clientes da plataforma

6. Responsável pelo projeto

- Campo de seleção
- Deve permitir busca por texto

Baseado no cadastro de usuários

7. Solicitante

- Campo de seleção
- Representa quem originou a demanda

Também baseado no cadastro de usuários

8. Equipes envolvidas

- Campo de seleção múltipla
- Permite vincular uma ou mais equipes ao projeto

👉 Regras:

- Deve ser possível cadastrar novas equipes

Deve ser possível editar ou excluir equipes existentes

9. Stakeholders

- Campo de seleção múltipla
- Permite associar pessoas interessadas no projeto

👉 Regras:

- Baseado no cadastro de stakeholders

Deve permitir busca por texto

10. Produto

- Campo de seleção
- Representa o produto ou solução impactada

👉 Exemplos:

- Aisten Chat
- Aisten Company
- Vendas Plus
- App Romance

👉 Regras:

- Deve ser possível cadastrar novos produtos

Deve ser possível editar ou excluir produtos existentes

Contexto estratégico do projeto

11. Objetivo

- Campo de texto livre

Deve descrever claramente o que o projeto pretende alcançar

12. Justificativa

- Campo de texto livre

Explica o motivo da execução do projeto

13. Benefícios esperados

- Campo de texto em formato de lista
- Permite registrar os ganhos esperados com o projeto

👉 Exemplo:

- Redução de custo
- Melhoria de performance
- Escalabilidade

Datas e controle de prazo

14. Data da solicitação

- Campo de data
- Deve vir preenchido automaticamente com a data atual

Pode ser alterado manualmente

15. Data prevista de entrega

Campo de data

- Define o prazo principal do projeto

👉 Regra importante:

Esse campo será utilizado como base para:

- indicadores de prazo
- alertas de atraso

visualização no Kanban

16. Data de conclusão

- Campo de data

Preenchido quando o projeto for finalizado

Documentação e anexos

17. Documentação

- Campo para inserção de link (ex: Confluence)

Deve permitir colar URL

18. Anexos

- Upload de arquivos:
 - PDFs
 - Imagens
 - Prints
 - Documentos

👉 Regras:

- Deve ser possível adicionar anexos a qualquer momento
- Deve ser possível excluir anexos
- Deve ser possível visualizar anexos já vinculados

19. Selecionar EAP:

Seleção da EAP

Deve existir um campo obrigatório: EAP do projeto

O usuário escolhe uma EAP previamente cadastrada

Aplicação automática

Ao selecionar a EAP:

- O sistema cria automaticamente as fases do projeto
- Essas fases aparecem no Kanban como colunas
- Também são registradas como marcos do projeto

Mesmo após aplicar a EAP:

- Deve ser possível adicionar novas fases manualmente
- Deve ser possível editar nomes e descrições

Deve ser possível remover fases (com controle de impacto)

Comportamento após criação

Após salvar o projeto:

- O projeto deve ser criado como um **card no Kanban**
- Deve respeitar a fase inicial padrão (ex: Backlog ou Análise)

Deve exibir informações principais no card (ex: título, responsável, prazo, status)

Edição do projeto

O sistema deve permitir edição completa do projeto após sua criação:

- Deve existir um botão de “Editar projeto”
- Esse botão deve abrir o mesmo modal de criação, já preenchido
- Todos os campos devem ser editáveis

Controle de permissões

Deve ser implementado um controle de acesso para edição de projetos:

- Apenas usuários autorizados (ex: PMO ou gestores) podem:
 - Criar projetos
 - Editar informações estruturais
 - Alterar campos críticos
- Usuários comuns podem:
 - Visualizar projetos
 - Interagir com tarefas (dependendo da permissão)

Diretrizes de sistema (importante)


- Todos os campos devem estar vinculados a dados estruturados (não apenas visuais)
- O cadastro de listas (clientes, produtos, equipes, stakeholders, finalidades) deve ser centralizado na área administrativa
- O modal deve ser reutilizável para criação e edição
- As informações devem refletir automaticamente em:
 - Kanban
 - Lista

- Detalhamento do projeto

Visualização do card do projeto (pós criação)

Após o cadastro do projeto, ele vira um card dentro do fluxo macro do projeto, o sistema deve permitir a abertura do **card detalhado do projeto**, que representa o ponto central de visualização e gestão de todas as informações relacionadas a ele.

Esse card deve ser acessível ao clicar no projeto, tanto na visualização em **Kanban** quanto em **Lista**, e deve apresentar de forma organizada todas as informações definidas no momento da criação do projeto.

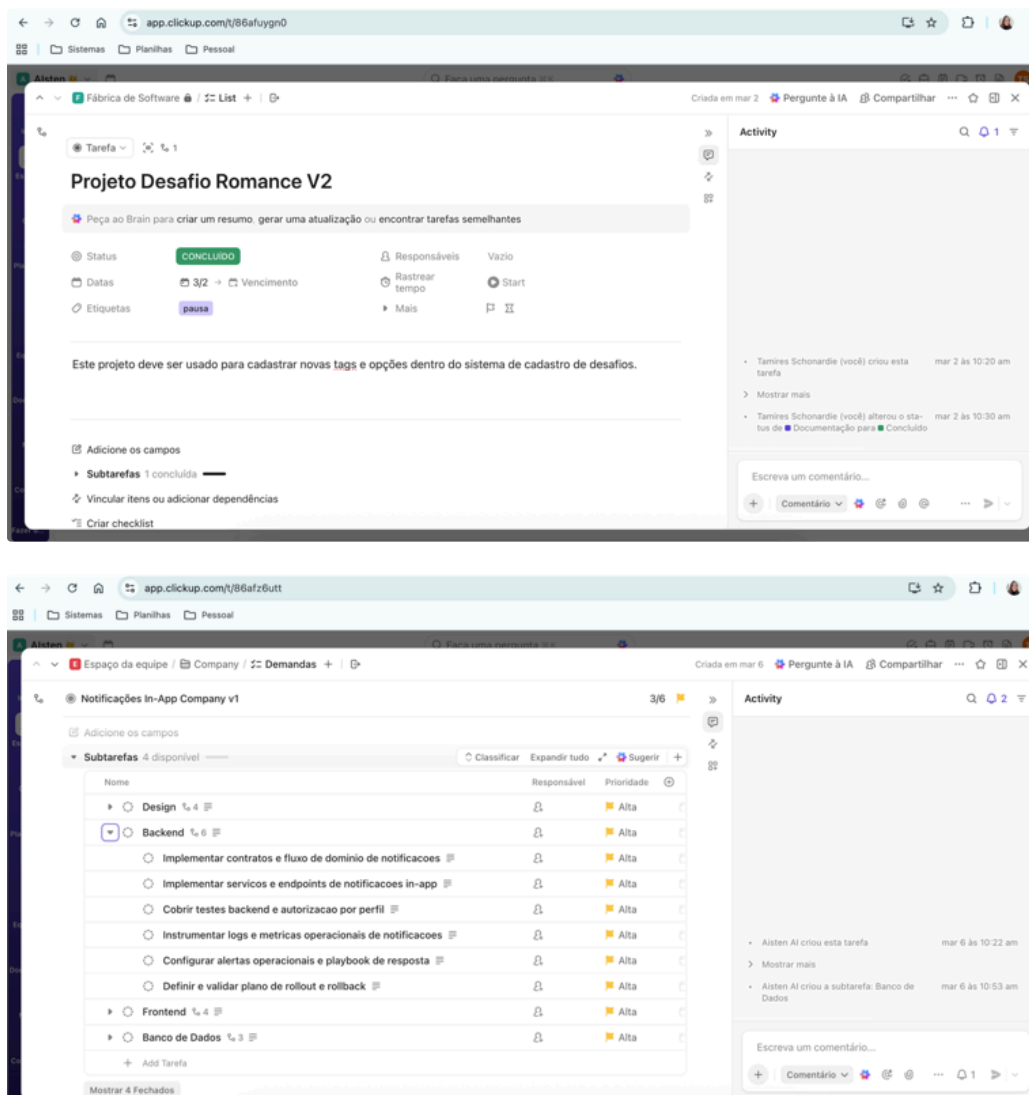

Observação importante sobre os exemplos (prints)

Os prints utilizados como referência são **exemplos de layout e organização visual**, utilizados para ilustrar como as informações podem ser exibidas.

👉 Importante:

- As informações exibidas no card **não devem ser fixas**
- O sistema deve **dinamicamente carregar os dados preenchidos no cadastro do projeto**
- Ou seja, todo o conteúdo deve ser baseado nos campos definidos anteriormente (título, responsável, cliente, datas, etc.)

Além disso, quanto maior for a capacidade do sistema de aproveitar e expandir funcionalidades dentro do card (como histórico, subtarefas, interações, etc.), melhor será a experiência de uso.

Estrutura do card do projeto

O card do projeto deve ser dividido em três áreas principais:

1. Cabeçalho (informações principais)
2. Corpo (conteúdo e estrutura do projeto)
3. Sidebar lateral (interações e histórico)


1. Cabeçalho do projeto

Identificação do projeto

- Nome do projeto (título principal)
- Tipo (ex: Projeto)
- Identificação do workspace/equipe
- Breadcrumb de navegação (opcional)

Status do projeto

- Exibido como badge visual (ex: Ativo, Pausado, cancelado)
- Deve ser editável via seletor
- Deve refletir diretamente no Kanban
- Quando o projeto estiver pausado ele deve aparecer na mesma fase em que foi pausado mas com um tom acinzentado como no exemplo do print abaixo:

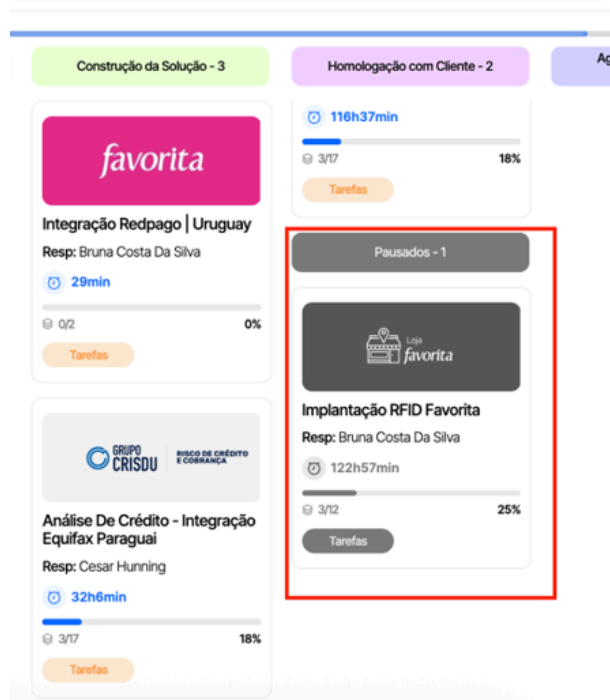

Responsáveis

- Exibição dos responsáveis vinculados
- Possibilidade de adicionar/remover usuários

Datas principais

- Data de solicitação
- Data prevista de entrega
- Data de conclusão

Prioridade e metadados adicionais

- Finalidade do projeto
- Produto vinculado
- Cliente
- Tags (cadastro e visual de tags no card do projeto)

2. Corpo do projeto

Descrição estruturada

O card deve exibir os principais campos definidos no cadastro:

- Objetivo do projeto
- Justificativa
- Benefícios esperados
- Ticket de origem

- Link de documentação (ex: Confluence)

👉 Esses campos devem:

- Permitir visualização clara
- Poder ser editáveis (se permitido)
- Suportar expansão/recolhimento (para textos longos)

Estrutura hierárquica (EAP + tarefas)

Esse é um dos pontos mais importantes do card.

O sistema deve exibir:

- As fases da EAP selecionada na criação do projeto
- Dentro de cada fase, as tarefas associadas
- Dentro das tarefas, subtarefas (com múltiplos níveis)

Comportamento esperado:

- As fases da EAP devem aparecer como agrupadores principais
- Deve ser possível expandir/recolher fases
- Deve ser possível visualizar a hierarquia completa:
 - Projeto
 - Fase
 - Tarefa
 - Subtarefas (níveis ilimitados)

Interações:

- Adicionar tarefas dentro das fases
- Adicionar subtarefas dentro das tarefas
- Reordenar itens
- Alterar status de cada item
- Visualizar progresso (ex: subtarefas concluídas)

3. Sidebar lateral (Activity e interação)

A lateral direita deve conter funcionalidades de acompanhamento e colaboração:

Histórico (Activity)

- Registro de ações:
 - Criação do projeto

- Alterações de status
- Inclusão de tarefas
- Atualizações

Comentários

- Campo para interação entre usuários
- Permite:
 - Texto
 - Menções (@usuário)
 - Anexos

Notificações

- Indicadores de atualizações recentes
- Alertas de interação

Comportamento geral do card

1. Abertura unificada

O card deve abrir da mesma forma independente de onde foi acessado:

- Kanban
- Lista

2. Sincronização total

Todas as alterações feitas no card devem refletir automaticamente em:

- Kanban do projeto
- Visualização em lista
- Estrutura da EAP
- Indicadores de progresso

3. EAP como base estrutural

- As fases exibidas no card devem ser exatamente as definidas na EAP selecionada
- A EAP deve estruturar a organização inicial
- Deve ser possível ajustar fases após a criação (com controle)

4. Flexibilidade e evolução

O card deve permitir:

- Inclusão de novas tarefas e subtarefas
- Alteração de responsáveis
- Atualização de datas
- Inclusão de anexos
- Evolução contínua do projeto

Diretriz de UX (muito importante)

O card do projeto deve:

- Ser limpo e organizado
- Visualização minimalista e moderna de forma a ficar bonita.
- Priorizar leitura rápida
- Permitir expansão de detalhes sob demanda
- Evitar excesso de informação visível ao mesmo tempo
- Manter consistência com o card de tarefas
- Cores claras, focando no azul que é a cor foco do Kanban e do Crisdu Labs.

Resumo funcional

O card do projeto é:

- O centro de gestão do projeto
- A representação visual da EAP + tarefas
- O ponto de acompanhamento de progresso
- O local de colaboração entre usuários

Visualização do card de tarefa e subtarefa

O sistema deve possuir um **único padrão de card/modal** para tarefas, independentemente do nível hierárquico. Ou seja:

- Tarefa
- Subtarefa
- Subtarefa de subtarefa

👉 Todas utilizam exatamente o mesmo componente visual e funcional.

👉 O que muda é apenas o **contexto hierárquico onde estão inseridas**.

Conceito principal

O card da tarefa representa o **nível operacional do sistema**, onde a execução do trabalho realmente acontece. Ele deve permitir:

- Detalhamento completo da atividade
- Interação entre usuários
- Controle de execução
- Rastreabilidade

Estrutura do card da tarefa

O card deve ser organizado em três blocos principais:

1. Cabeçalho (identificação e status)
2. Corpo (conteúdo e execução)
3. Sidebar (interações e histórico)

1. Cabeçalho da tarefa

Identificação

- Nome da tarefa (título principal)
- Campo editável
- Deve permitir identificação clara da atividade

Descrição breve

- Campo de texto livre
- Usado para contextualizar rapidamente a tarefa
- Deve permitir edição

Status

- Exibido como badge (ex: Backlog, Em andamento, Testes, Concluído)
- Deve ser alterado via seletor
- Deve refletir diretamente no Kanban

2. Metadados da tarefa

Responsável

- Usuário principal responsável pela execução

Solicitante

- Quem criou ou delegou a tarefa

Envolvidos (stakeholders)

- Campo de múltipla seleção
- Representa pessoas que participam ou acompanham

3. Corpo da tarefa (execução)

Subtarefas e hierarquia

- Exibição das subtarefas vinculadas
- Suporte a múltiplos níveis hierárquicos
- Possibilidade de expandir/recolher

Interações disponíveis:

- Adicionar subtarefa
- Editar subtarefa
- Reordenar
- Navegar entre níveis

4. Checklist

- Lista de itens dentro da tarefa
- Usado para controle de execução

Funcionalidades:

- Adicionar itens
- Marcar como concluído
- Visualizar progresso (ex: 3/5 concluídos)

5. Controle de tempo (muito importante)

O sistema deve permitir dois formatos de registro de tempo:

Tempo manual

- Campo para inserção manual (ex: 2h, 30min)

Timer (contador)

- Botão de iniciar
- Botão de pausar
- Contador automático de tempo

Regra de negócio importante:

O tempo registrado deve impactar:

- A tarefa atual
- Todas as tarefas pai (subida hierárquica)
- O projeto como um todo

👉 Exemplo:

Tempo registrado em uma subtarefa

→ soma na tarefa

→ soma no projeto

6. Comentários/Histórico

- Campo para interação entre usuários

Funcionalidades:

- Inserir comentários
- Mencionar usuários (@)
- Anexar arquivos
- Histórico de conversas

7. Sidebar (atividade e histórico)

Activity (histórico)

- Registro de ações:
 - criação
 - alteração de status
 - comentários
 - edição de campos

Notificações

- Indicadores de atualizações
- Interações recentes
- Tarefa incluída na fila do usuário

Comportamento do card

1. Reutilização total

Esse mesmo card deve ser utilizado para:

- Tarefas no Kanban
- Tarefas na lista
- Subtarefas em qualquer nível

2. Consistência de dados

Qualquer alteração feita no card deve refletir automaticamente em:

- Kanban
- Lista
- Card do projeto
- Estrutura da EAP

3. Hierarquia dinâmica

O card deve respeitar o nível hierárquico:

- Exibir tarefa pai (se existir)
- Exibir subtarefas
- Permitir navegação entre níveis

4. Flexibilidade

O sistema deve permitir:

- Criar tarefas independentes
- Vincular a projetos posteriormente
- Criar subtarefas ilimitadas

Diretriz de UX

O card deve:

- Ser limpo e organizado
- Priorizar execução da tarefa
- Evitar excesso de informação inicial
- Permitir expansão de detalhes

Resumo conceitual

- O card de tarefa é o núcleo operacional do sistema
- Todas as tarefas compartilham o mesmo modelo
- A diferença entre tarefa e subtarefa é apenas hierárquica
- O controle de tempo e execução acontece dentro desse card

Ele deve ser consistente em todas as visualizações

Visualização do quadro Kanban Macro (de projetos):

Nível Macro, a gestão e a PMO terão uma visão geral em um quadro com todos os projetos, de todas as equipes, o quadro terá os seguintes filtros:

equipe/responsável/ano/projeto/cliente/solicitante.

Os projetos serão visíveis em visualização kanban, onde o card será o projeto nesse caso. Além disso deve ser possível visualizar em formato de lista projeto e suas tarefas.

Ao clicar no card, cada projeto terá uma EAP própria:

Projeto X

|— Fase: Análise

| |— Tarefa 1

| |— Tarefa 2

|— Fase: Desenvolvimento

| |— Tarefa 3

|— Fase: Entrega

Gestão:

Vê todos projetos (Kanban macro)

Com status real (não fake)

✓ Equipes:

Trabalham no nível de tarefa (EAP)

Podem ter visões filtradas

✓ PMO:

Controla marcos por fase

Mede tempo por fase (não por tarefa)

Padroniza análise, doc, execução

Ideias de planejamento:

Tela Inicial: Ao acessar a ferramenta, o usuário deve visualizar uma tela inicial com visão consolidada do ambiente, contendo:

Objetivo: Dar uma visão rápida da operação e permitir navegação entre equipes.

 Conteúdos da tela: Indicadores gerais; Projetos em andamento; Projetos atrasados; Projetos concluídos por ano; Projetos próximos do prazo; Resumo de atividades recentes; Atalhos rápidos (ex: criar projeto, acessar fluxos)

 Seleção de Espaço (Equipes) Dentro da tela inicial, deve existir a possibilidade de selecionar um “espaço” (workspace).

 Conceito de espaço: Cada equipe possui seu próprio espaço. Exemplo:

Aisten (AIO)

Fábrica de Software

Citi (infra)

Adapto

 Comportamento:

Usuários padrão:


Visualizam apenas o(s) espaço(s) da sua equipe

Gestão (PMO / CEO):

Visualiza todos os espaços, de todas as equipes

Pode alternar entre eles ou ver consolidado.

Exemplo de visualização/design:

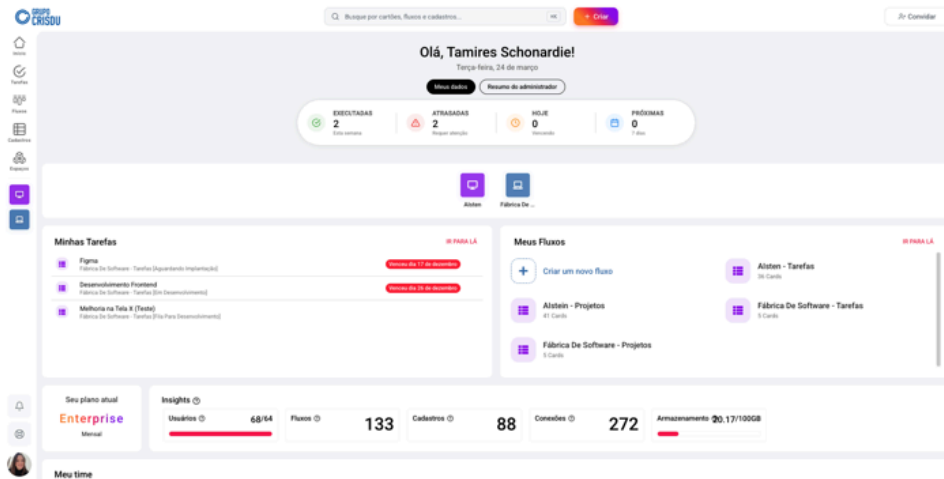

Visualização do kanban de projetos:

A tela de Kanban de projetos deve ser a **principal visualização operacional da ferramenta**, permitindo que o usuário acompanhe o andamento dos projetos de forma rápida, visual e orientada a prazos.

Ao acessar um projeto (ou o workspace de projetos), o usuário deve ter a possibilidade de alternar entre três formas de visualização:

- **Kanban (padrão e principal)**
- **Lista**
- **Gráfico de Gantt**

Essas três visualizações representam o **mesmo conjunto de dados**, apenas exibidos de formas diferentes.

2. Estrutura do Gantt:

O Gráfico de Gantt do Kanban deve manter como base os marcos importantes do projeto. Para cada marco/fase do projeto, o Gantt deve exibir as seguintes colunas:

- **Nome da fase**
 - Deve permitir edição do nome.
- **Responsável pela fase**
 - Campo de seleção do responsável (puxar usuários do optimus, se for complexo, usar campo de texto).
- **Dias na fase**
 - Campo calculado automaticamente com base nas datas.
- **Data inicial**

- Data de início da fase.
- **Data prevista Inicial**
 - Data de previsão de conclusão da fase (prazo planejado).
- **Data final**

Data oficial de conclusão da fase.
- **Data prevista Final**
 - Data de previsão de conclusão da fase (prazo planejado).

Além disso, deve ser possível reorganizar (coluna de prioridade nos marcos) a ordem das fases diretamente no Gantt, permitindo ajustes no planejamento conforme a necessidade do projeto. Quando as datas das colunas previstas estiverem dentro do prazo a cor do número será verde e se estiver atrasado ficará vermelho.

4. **Gestão de Marcos diretamente pelo Kanban:** Deve ser possível criar, editar e ajustar marcos diretamente no Gráfico de Gantt do Kanban, sem necessidade de cadastro prévio ou dependência do Optimus.


A funcionalidade deve permitir:

- Inclusão de novos marcos.
- Edição de fases existentes.
- Ajustes de datas e responsáveis.
- Prioridade para a visualização da ordem das fases.
- Não permitir datas negativas.
- Não permitir datas inconsistentes (ex.: data final anterior à data inicial).


5. **Marcos automáticos por fase:** O sistema deve gerar automaticamente marcos com base nas principais fases do Kanban, registrando no gantt:

- Data de Início da Fase;
- Data de finalização da fase.
- Essas datas devem ser capturadas automaticamente a partir das movimentações do card entre as fases do Kanban, criando um histórico real de execução. Mas apesar disso, o sistema deve permitir ajustes manuais: Editar o nome dos marcos (ex.: personalizar fases, incluir marcos específicos). Ajustar manualmente as datas, quando necessário, por exemplo: Inclusão de novos marcos não previstos inicialmente; Pausas no projeto; Ajustes pontuais.


Exemplo de design para visualização dos marcos no card do kanban:

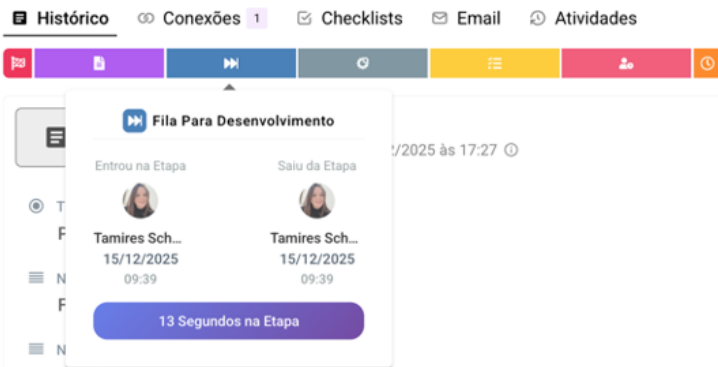

O sistema deve ter um botão dentro do Card do Kanban, que encaminha para a visualização do Gantt daquele projeto. Ideia de visualização da parte de datas e edição do gantt:

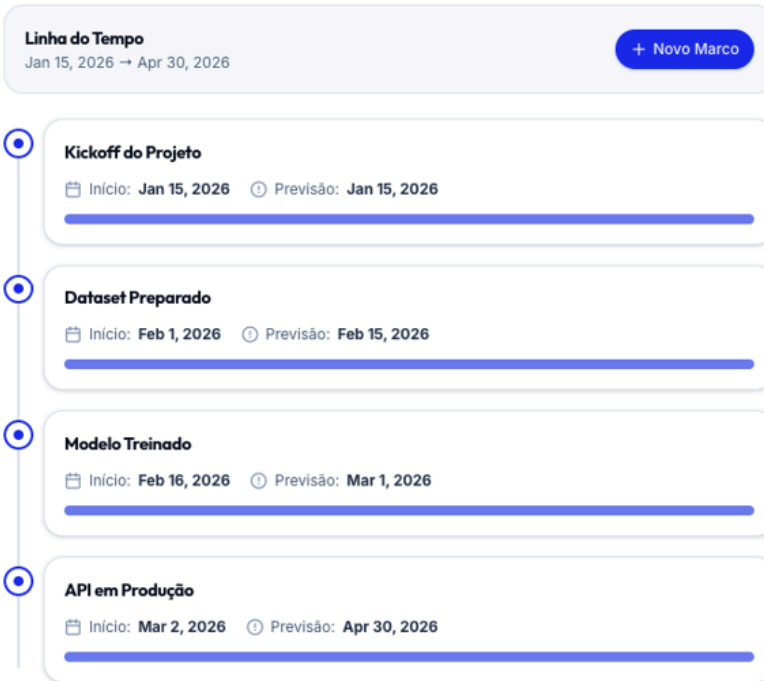

Estilo de gráfico de Gannt:

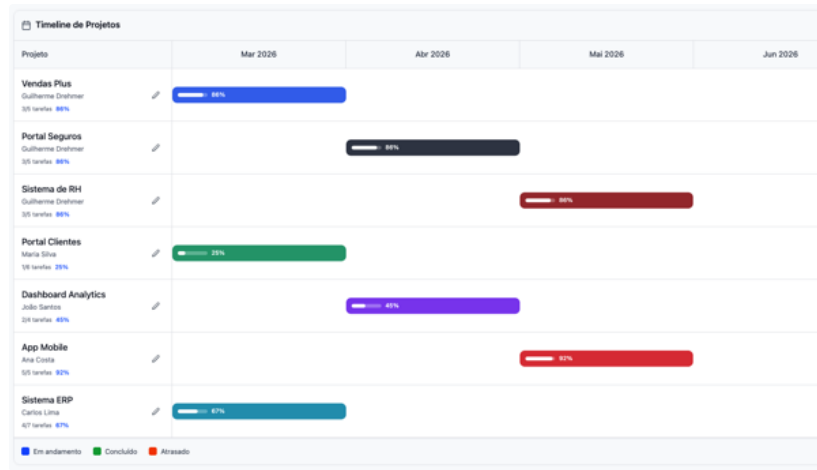

⌵	🔍 Distribuição de cargas - V2	398 Dias	10/08/2022	11/09/2023
●	Análise da Solicitação	16 Dias	10/08/2022	25/08/2022
●	Construção da solução - Part 1	84 Dias	25/08/2022	16/11/2022
●	Construção da solução - Part 2	103 Dias	16/11/2022	28/02/2023
●	Homologação com o cliente	85 Dias	14/04/2023	07/07/2023
●	Acompanhamento Pós Entrega	57 Dias	10/07/2023	04/09/2023
●	Entrega do Projeto	1 Dia	10/07/2023	10/07/2023
●	Virada V1 > V2	1 Dia	11/09/2023	11/09/2023

Estrutura da tela

A tela deve ser organizada em três blocos principais:

1. Barra superior (contexto + filtros + navegação)

- Nome do workspace/projeto
- Filtros (centralizados e únicos — sem duplicidade)
- Alternância de visualização:
 - Kanban
 - Lista
 - Gantt

👉 Importante:




Os filtros devem impactar todas as visualizações de forma consistente.

Deve ser possível filtrar por Projeto, por equipe, por produto, por ano, por solicitante, por responsável, por cliente.

4. Importante poder filtrar por Produto (ex: Todos os projetos do Aisten chat, ou todos os projetos do Company...).

Filtro Por datas de entrega/inclusão.

Ideias de formato de filtro existente no cange hoje que poderíamos incorporar.

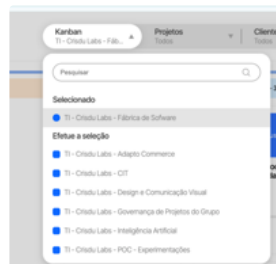

Filtros/Opções

2. Área principal — Kanban

O Kanban deve ser estruturado em **colunas que representam as fases da EAP do projeto**, por exemplo:

- Backlog
- Análise
- Documentação
- Desenvolvimento
- Testes
- Homologação
- Concluído

👉 Essas colunas:

- São dinâmicas (definidas pela EAP)
- Podem variar por tipo de projeto
- Representam o fluxo real do projeto

3. Cards de Projeto

Cada projeto é representado por um **card dentro da coluna correspondente à sua fase atual.**

Estrutura do card do projeto no Kanban

O card deve ser visualmente limpo, mas informativo.

1. Cabeçalho do card

- Imagem de capa (quando existir)
- Nome do projeto (título principal)
- Cliente (opcional, mas visível)
- Responsável

2. Informações resumidas

- Tempo estimado ou consumido
- Quantidade de tarefas (uma tarefa só é concluída se ela estiver na fase concluída e todas as subtarefas dela forem concluídas também...) (ex: 7/18)
- Percentual de progresso

👉 Essas informações ajudam a entender rapidamente o status do projeto

3. Indicador de progresso

- Barra de progresso visual
- Baseada na evolução das tarefas/marcos

4. Botão de ação

- Ex: “Tarefas”
- Permite acessar rapidamente o detalhamento

5. Exibição da Data de Vencimento (REGRA CRÍTICA)

Na parte inferior do card deve existir um **indicador de prazo altamente visual e contextual.**

Esse é um dos elementos mais importantes do Kanban.

Comportamento do campo de vencimento

O sistema deve interpretar automaticamente a data de vencimento e exibir o status conforme a proximidade:

1. Prazo normal (longe do vencimento)

Texto:

- “Vence em [data]”

Visual:

- Cor neutra ou verde
- Sem alerta

2. Prazo próximo

Texto:

- “Vence amanhã!”

Visual:

- Amarelo ou laranja
- Indica atenção

3. Prazo crítico

Texto:

- “Vence hoje!”

Visual:

- Vermelho
- Indica urgência

4. Prazo vencido

Texto:

- “Prazo vencido”

Visual:

- Vermelho forte
- Pode incluir ícone de alerta

Regras importantes

- A data deve vir do campo **Data de Previsão de Entrega do projeto**
- Atualização deve ser automática (tempo real)
- Não pode depender de ação do usuário

- Deve ser visível diretamente no card (sem abrir modal)

6. Comportamento visual (UX)

O indicador de vencimento deve:

- Ficar na parte inferior do card
- Ter alto contraste visual
- Ser facilmente escaneável
- Ajudar na priorização visual do Kanban

Integração com as demais visualizações

Kanban ↔ Lista ↔ Gantt

Todas devem refletir os mesmos dados:

- Mudança de fase → atualiza Kanban + Lista + Gantt
- Alteração de prazo → reflete em todos
- Atualização de progresso → sincronizada

Comportamentos adicionais importantes

1. Drag and drop

- Projetos podem ser movidos entre colunas
- Isso altera automaticamente a fase do projeto

2. Projetos pausados

- Devem aparecer no Kanban
- Com visual diferenciado (acinzentado)
- Mantidos na mesma coluna

3. Abertura do projeto

Ao clicar no card:

- Abre o modal completo do projeto
- Com:
 - Dados do cadastro
 - EAP
 - Tarefas
 - Marcos

- Gantt


Diretriz de design


O Kanban deve ser:

- Visualmente limpo
- Altamente escaneável
- Focado em execução
- Com uso inteligente de cores (principalmente prazos)


Resumo executivo

- O Kanban é a visualização principal do sistema
- As colunas representam a EAP do projeto
- Os cards representam projetos
- Cada card deve mostrar:
 - Nome
 - Responsável
 - Progresso
 - Tarefas
 - Prazo (com indicador dinâmico)
- A data de vencimento é um elemento crítico de UX
- O sistema deve reagir automaticamente ao tempo

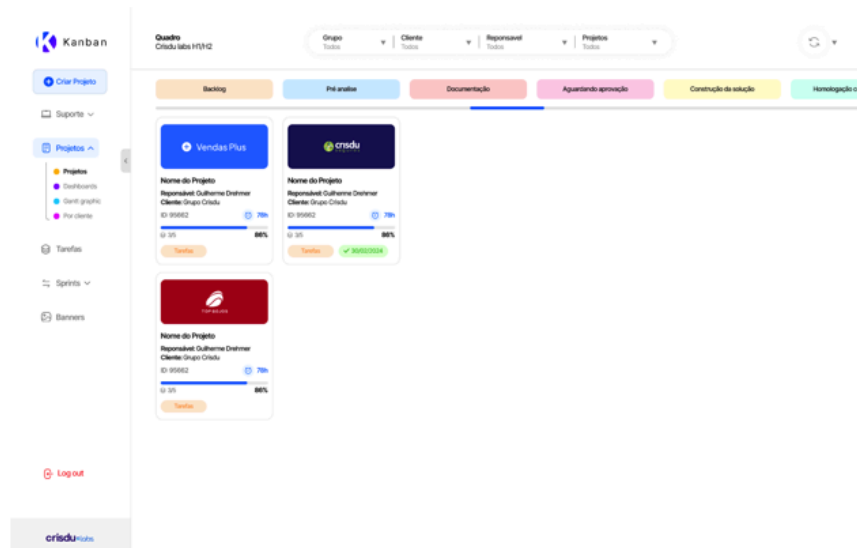

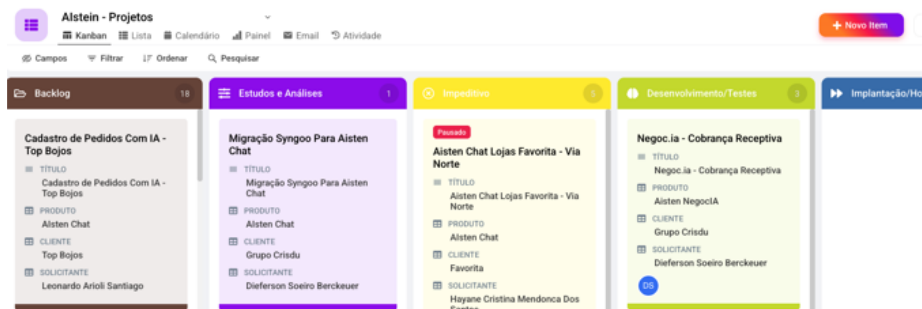

Exemplo de layout abaixo:



Regra de Estrutura: Separação entre Governança (Projeto) e Execução (Tarefas)

O sistema deve operar com **dois níveis distintos de fluxo**, cada um com um papel bem definido:

1. Fluxo de Governança (nível do projeto)

Todo projeto **nasce e é controlado inicialmente dentro de um fluxo de governança**.

Esse fluxo representa o acompanhamento **macro do projeto**, com foco em:

- Status geral
- Etapas estratégicas
- Evolução do projeto como um todo
- Controle do PMO

Características do fluxo de governança:

- Baseado em **colunas (Kanban)**
- Cada coluna representa uma **fase macro do projeto**, por exemplo:
 - Backlog
 - Análise
 - Documentação

- Aprovação
 - Execução
 - Homologação
 - Concluído
- O **card do projeto se move entre essas colunas**
 - O movimento entre fases representa a evolução do projeto no nível estratégico
-

2. Gestão do fluxo de governança (controle do PMO)

A manutenção desse fluxo é **responsabilidade exclusiva do PMO**.

O sistema deve permitir que o PMO:

- Crie novas fases (colunas)
- Edite nomes das fases
- Reordene as fases livremente (drag and drop)
- Exclua fases (com regras de segurança, se houver projetos vinculados)

👉 Importante:

Usuários comuns **não podem alterar esse fluxo**, apenas visualizar e movimentar projetos (se permitido).

3. Fluxo de Execução (nível de tarefas — dentro da EAP)

Enquanto o projeto está no fluxo de governança, a execução real acontece dentro dele, através da **EAP (Estrutura Analítica do Projeto)**.

A EAP representa o **desdobramento operacional do projeto**, onde ficam:

- Tarefas
 - Subtarefas
 - Subníveis hierárquicos
 - Entregas reais
-

Características da EAP:

- Cada projeto possui sua própria EAP
- A EAP é definida no momento da criação do projeto (via template)
- A EAP é composta por **fases operacionais**, que podem ou não refletir o fluxo de governança

Exemplo:

Projeto (Governança):

- Em Execução

EAP (Execução interna):

- Análise técnica
 - Desenvolvimento
 - Testes
 - Ajustes
 - Validação
-

4. Relação entre Governança e EAP

- O **fluxo de governança controla o status macro do projeto**
- A **EAP controla a execução detalhada**

Esses dois níveis devem coexistir, mas com papéis distintos:

Nível	Objetivo	Visão
Governança	Controle estratégico	Macro
EAP	Execução do trabalho	Detalhado

5. Regras de funcionamento

- Todo projeto obrigatoriamente:
 - Nasce no fluxo de governança
 - Possui uma EAP vinculada
 - O avanço no fluxo de governança pode:
 - Ser manual (decisão do PMO)
 - Ou baseado em critérios (ex: % de tarefas concluídas — opcional)
 - As tarefas **não vivem no Kanban de governança**
 - Elas vivem dentro da EAP do projeto
-

6. Visualização no sistema

- O usuário visualiza:

- **Kanban de projetos (governança)**

- Ao clicar no projeto → acessa:

- EAP
 - Tarefas
 - Gantt
 - Detalhes
-

Resumo direto (para IA ou documentação)

- Existe um Kanban de governança (projetos)
 - Existe um fluxo interno de execução (EAP com tarefas)
 - O projeto é o card no Kanban
 - As tarefas vivem dentro do projeto (não no Kanban global)
 - O PMO controla as fases do Kanban de governança
 - A execução real acontece dentro da EAP
-

Seção Complementar — Estrutura Técnica e Regras de Execução

Esta seção tem como objetivo transformar a visão funcional do sistema em um modelo executável, garantindo que a implementação (por IA ou desenvolvimento) ocorra de forma consistente, previsível e alinhada às regras de negócio definidas anteriormente.

1. Modelo de Dados (Estrutura Base do Sistema)

O sistema deve ser estruturado com base em entidades principais, que garantem a rastreabilidade, consistência e escalabilidade da solução.

1.1 Projeto (Project)

Representa o nível macro da gestão.

Campos principais:

- id
- título
- status (ativo, pausado, cancelado)
- finalidade

- cliente_id
 - responsável_id
 - solicitante_id
 - produto_id
 - eap_id
 - data_solicitacao
 - data_prevista_entrega
 - data_conclusao
 - objetivo
 - justificativa
 - beneficios
 - ticket_origem
-

1.2 Tarefa (Task)

Representa o nível operacional do sistema.

Campos principais:

- id
 - project_id (opcional — tarefa pode existir sem projeto)
 - parent_task_id (permite hierarquia ilimitada)
 - título
 - descrição
 - status
 - responsável_id
 - solicitante_id
 - prioridade
 - data_inicio
 - data_prevista
 - data_conclusao
-

1.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Define o fluxo macro do projeto.

Campos principais:

- id
 - nome
 - descrição
 - tipo_projeto
 - status (ativo/inativo)
-

1.4 Fases (Phase)

Representam as colunas do Kanban.

Campos principais:

- id
 - eap_id
 - nome
 - ordem
 - descrição
-

1.5 Controle de Tempo (Time Log)

Responsável pelo rastreamento de tempo.

Campos principais:

- id
 - task_id
 - user_id
 - tempo_manual
 - tempo_timer
 - data_inicio
 - data_fim
-

2. Regras de Negócio (Críticas para Funcionamento)

2.1 Conclusão de Tarefa

Uma tarefa só pode ser considerada concluída quando:

- seu status estiver como “Concluído”
- todas as suas subtarefas também estiverem concluídas

2.2 Hierarquia de Tarefas

- O sistema deve permitir níveis ilimitados de subtarefas
- Cada tarefa pode ter uma tarefa pai
- Alterações em níveis inferiores devem impactar níveis superiores (ex: tempo, progresso)

2.3 Controle de Tempo

- O tempo registrado em uma subtarefa deve somar:
 - na tarefa pai
 - no projeto
- Deve existir:
 - input manual
 - timer (iniciar / pausar)

2.4 Mudança de Fase (Kanban)

Ao mover um projeto entre colunas:

- Atualizar fase atual do projeto
- Registrar histórico (activity)
- Atualizar Gantt automaticamente (início/fim da fase)
- Disparar automações (se configuradas)

2.5 Persistência de Dados

- Nenhuma ação do usuário deve ser perdida ao trocar de tela
- Reordenação, criação e edição devem ser persistidas automaticamente

2.6 Separação de Fluxos

- Projetos vivem no Kanban de Governança
 - Tarefas vivem dentro da EAP do projeto
 - Tarefas não devem aparecer no Kanban macro de projetos
-

3. Fluxos Executáveis do Sistema

3.1 Criação de Projeto

1. Usuário clica em “Criar Projeto”
 2. Sistema abre modal de cadastro
 3. Usuário preenche os campos
 4. Ao salvar:
 - cria o projeto
 - aplica a EAP selecionada
 - cria automaticamente as fases (colunas)
 - define fase inicial
 - registra histórico
-

3.2 Criação de Tarefa

1. Usuário cria tarefa dentro de uma fase
 2. Sistema vincula ao projeto (se aplicável)
 3. Permite:
 - adicionar subtarefas
 - definir responsáveis
 - registrar tempo
-

3.3 Movimentação no Kanban

1. Usuário arrasta card
 2. Sistema:
 - atualiza fase
 - registra histórico
 - recalcula prazos e indicadores
-

3.4 Registro de Tempo

1. Usuário inicia timer ou adiciona manualmente
2. Sistema:
 - salva registro
 - soma nos níveis superiores
 - atualiza métricas do projeto

4. Critérios de Aceite (Obrigatórios para Validação)

4.1 Kanban

- Deve permitir drag and drop entre colunas
- Deve permitir reordenação vertical
- Deve persistir após reload
- Deve refletir alterações em tempo real

4.2 Card do Projeto

- Deve carregar dinamicamente os dados do cadastro
- Deve exibir EAP + tarefas
- Deve permitir edição (se autorizado)
- Deve manter sincronização com Kanban, Lista e Gantt

4.3 Card de Tarefa

- Deve funcionar igual para todos os níveis (tarefa/subtarefa)
- Deve permitir:
 - criação de subtarefas
 - checklist
 - controle de tempo
 - comentários

4.4 Filtros

- Devem estar centralizados em um único local
- Devem permitir múltipla seleção
- Devem impactar todas as visualizações (Kanban, Lista e Gantt)

4.5 Gantt

- Deve refletir as fases do projeto
 - Deve atualizar automaticamente conforme movimentação
 - Deve permitir edição manual
-

5. Escopo de Implementação (Prioridade)

Para garantir eficiência na implementação, o sistema deve ser dividido em fases:

MVP (Implementação Inicial)

- Cadastro de Projeto
 - EAP
 - Kanban de Projetos
 - Card de Projeto
 - Card de Tarefa
 - Hierarquia de subtarefas
 - Controle de tempo
-

Fase 2

- Gantt
 - Dashboard
 - Filtros avançados
 - Indicadores
-

Fase 3

- Automações
 - Agenda
 - Integrações externas
 - IA
-

6. Diretriz Final de Implementação

O sistema deve seguir os seguintes princípios:

- Todos os dados devem ser estruturados (não apenas visuais)
- Toda ação deve gerar persistência
- Toda alteração deve refletir em tempo real nas demais visualizações
- A experiência deve ser:
 - limpa
 - minimalista
 - intuitiva

- A separação entre Governança e Execução deve ser respeitada em toda a arquitetura
-

Resumo Final

Esta seção garante que:

- O sistema deixe de ser apenas visual
- Passe a ser estruturado e executável
- Permita implementação consistente por IA ou equipe técnica
- Evite retrabalho, inconsistência e comportamento inesperado

Sonhos/solicitações futuras não para a primeira versão:


1. **Tarefas automáticas:** No card de tarefas do Kanban, usuários ADM podem acionar criação automática de tarefas, sem duplicidade, com base nos templates que serão cadastrados na ferramenta.
2. **Reordenação Manual da ordem de prioridade dos projetos:** permitir que os cards sejam arrastados não apenas entre fases, mas também reordenados verticalmente para refletir a prioridade de execução.
 - Habilitar o arraste dos cards para cima ou para baixo dentro da mesma coluna, definindo a ordem de priorização.
 - A ordem definida deve ser persistida no sistema, mantendo a priorização mesmo após atualização da página ou novo acesso.
 - A visualização deve refletir claramente a prioridade, considerando que o card no topo da coluna representa a maior prioridade.
 - Permitir que apenas usuários autorizados possam alterar a ordem de prioridade.
3. **Automações:** Criar a possibilidade de automações simples (N8N?), como por exemplo o envio de e-mails padrões na mudança de fase de um projeto de acordo com o cadastro de stakeholders (que possui o e-mail hoje).
 - Possibilitar a definição de regras automáticas, como: Quando um projeto for aprovado no Kanban de Governança, ele deve ser incluído automaticamente no backlog da Fábrica de Software.
 - Essas regras devem ser configuráveis, sem necessidade de ajustes técnicos a cada mudança.

4. **Área/Kanban para controle de tarefas individuais:** Criar, dentro do Kanban, uma área dedicada à gestão individual de tarefas, permitindo um acompanhamento mais visual, organizado e eficiente das atividades atribuídas a cada usuário. Essa melhoria também abre espaço para uma evolução na gestão das tarefas de suporte.

Sugestão:

- Área de controle individual de tarefas: Criar uma tela no Kanban onde cada usuário possa visualizar suas próprias tarefas (tickets), vinculadas ao Optimus Atendimento. As tarefas podem estar associadas tanto a projetos quanto a demandas operacionais (melhoria/suporte), mas deve ser possível filtrar as tarefas provenientes de cada tipo de demanda e no caso de projeto, deve ser possível filtrar por projeto quais tarefas pertencem a ele.
- O usuário admin deve ter visualização de todas as demandas de todos os envolvidos e conseguir priorizar elas (no caso de um coordenador precisar priorizar demandas de testes e etc).
- O usuário deve ser notificado quando a tarefa estiver na fila dele, deve ser possível enviar tarefas entre os usuários do sistema também (exemplo: desenvolvedor finalizou a programação, já envia para testes com o time de QA).
- Deve ser possível que cada usuário visualize individualmente suas próprias tarefas nesta tela. Além disso, deve existir uma visualização geral, em formato de lista e formato Kanban, com todas as tarefas (sejam elas vinculadas a projetos ou não).

Exemplo abaixo:



- Além disso, para os usuários admins, deve ser possível visualizar e filtrar as tarefas de todos os usuários (para controle e gestão de tarefas, produtividade, andamento e etc...)
- O sistema deve oferecer uma agenda individualizada para que cada usuário gerencie seus compromissos e reuniões de forma organizada (tendo lembretes no dia e horário da reunião/agendamento). Ao agendar um evento, deve ser possível convidar outros

participantes, que receberão notificações automáticas e terão o compromisso inserido em suas próprias agendas para garantir o controle de disponibilidade.

Para a gestão coletiva, o sistema precisa disponibilizar uma visão geral que permita visualizar todas as reuniões e seus respectivos participantes em um único painel. Um ponto crítico dessa funcionalidade é o gerenciamento de recursos: deve haver um controle rigoroso das salas de reunião, impedindo conflitos de agenda e garantindo que o mesmo espaço não seja reservado para mais de um grupo no mesmo horário.

13. Permitir a inclusão de etiquetas no card do projeto, pendências externas (ex: aguardando comercial/financeiro/fornecedor). Exemplo:

